Künten - Eggenwil AO/IO; K271 Ausbau mit Radweg und Eggenwil IO/AO; K271 Gehweg Badenerstrasse

KANTON AARGAU **Wir bauen für Sie**

Situation mit Bauphasen

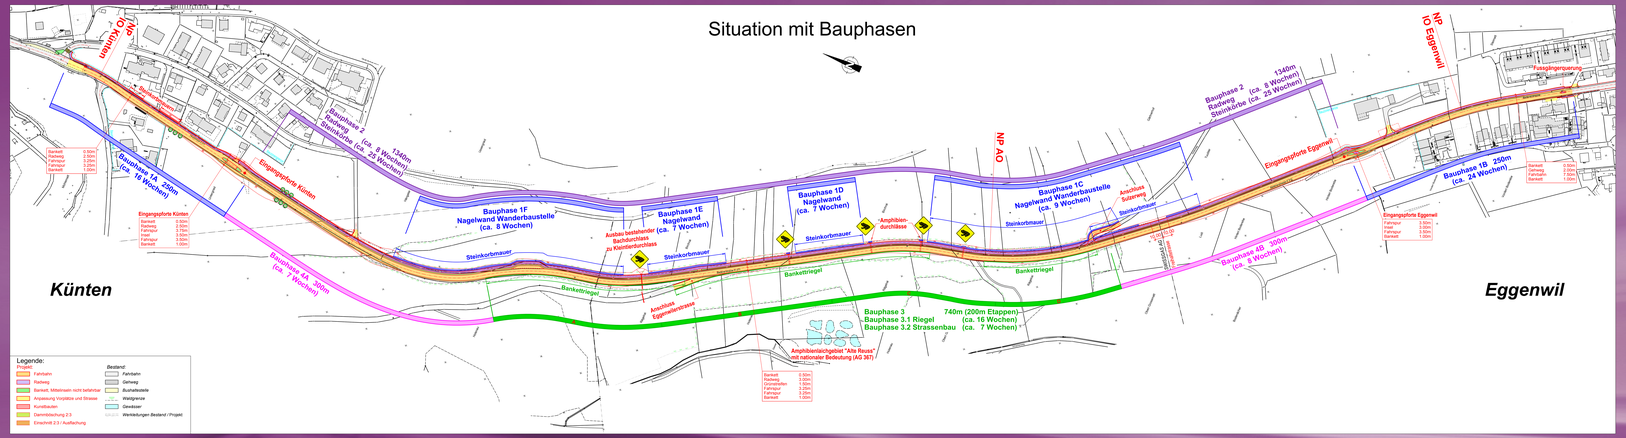

Bauablauf ausserorts

Nagelwand (ca. 31 Wo.)
(Bauphase 1C bis 1F)



Bauphase 1C
- Verkehr einspurig auf bestehender Fahrbahn mit Lichtsignalanlage
- Planum für Spritzbetonarbeiten 2.5m
- Bohrungen mit Schreitbagger

Steinkorbmauer und Radweg (ca. 28 Wo.)
(Bauphase 2)



Bauphase 2
- Verkehr einspurig auf bestehender Fahrbahn mit Lichtsignalanlage

Bankettriegelsicherung (ca. 16 Wo.)
(Bauphase 3.1)



Bauphase 3.1
- Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage
- Bauetappen bis 250m
- Bohrungen von best. Strasse aus, mit Schreit- oder Kompaktbagger

Strassenbau (ca. 7 Wo.)
(Bauphase 3.1)



Bauphase 3.2
- Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage
- Bauetappen bis 250m

Normalprofil IO Künten



Normalprofil AO



Normalprofil IO Eggenwill



Bauprogramm

ab 18. Mai 2015	Baustart mit Installationen und Vorbereitungen
Juni '15 bis Okt. '15	Bauphase 1A IO Künten
Juni '15 bis Nov. '15	Bauphase 1B IO Eggenwil
Juni '15 bis Jan. '16	Bauphase 1C-F Nagelwand
Sep.'15 bis März '16	Bauphase 2 Radweg und Steinkorbmauer
April'16 bis Aug. '16	Bauphase 3.1 Bankettriegelsicherung
Aug.'16 bis Sep. '16	Bauphase 3.2 Strassenbau
Juni '16 bis Aug. '16	Bauphase 4A Künten Strassenbau
Juni.'16 bis Aug. '16	Bauphase 4B Eggenwil Strassenbau
Oktober 2016	Fertigstellung Kunstbauten und Strassenbau (exkl. Deckbelag)
Juni 2017	Einbau Deckbelag und Fertigstellungsarbeiten

Verfolgen Sie den Baufortschritt: www.ag.ch/kuenten-eggenwil

Projektbeteiligte

Bauherren:

KANTON AARGAU

GEMEINDE KÜNTEN

AEW ENERGIE AG
Mitglied der axpo

GEMEINDE EGGENWIL

Planung und Bauleitung:

Gerber+Partner
Bauingenieure und Planer AG

Geotechnik:

BAUMANN+FLUM AG
Geotechnik - Geologie

Bodenkundliche Baubegleitung:

CSD INGENIEURE
VON GRUND AUF DURCHDACHT

Bauunternehmer:

ARGE GRACEL

H. GRAF AG

cellere
